


高嶺小中学校移転整備基本計画



- 事業スケジュール
- 事業費
- 事業費（補助金等の活用）

事業スケジュール


※手続き等がスムーズに行われた場合の最短スケジュール

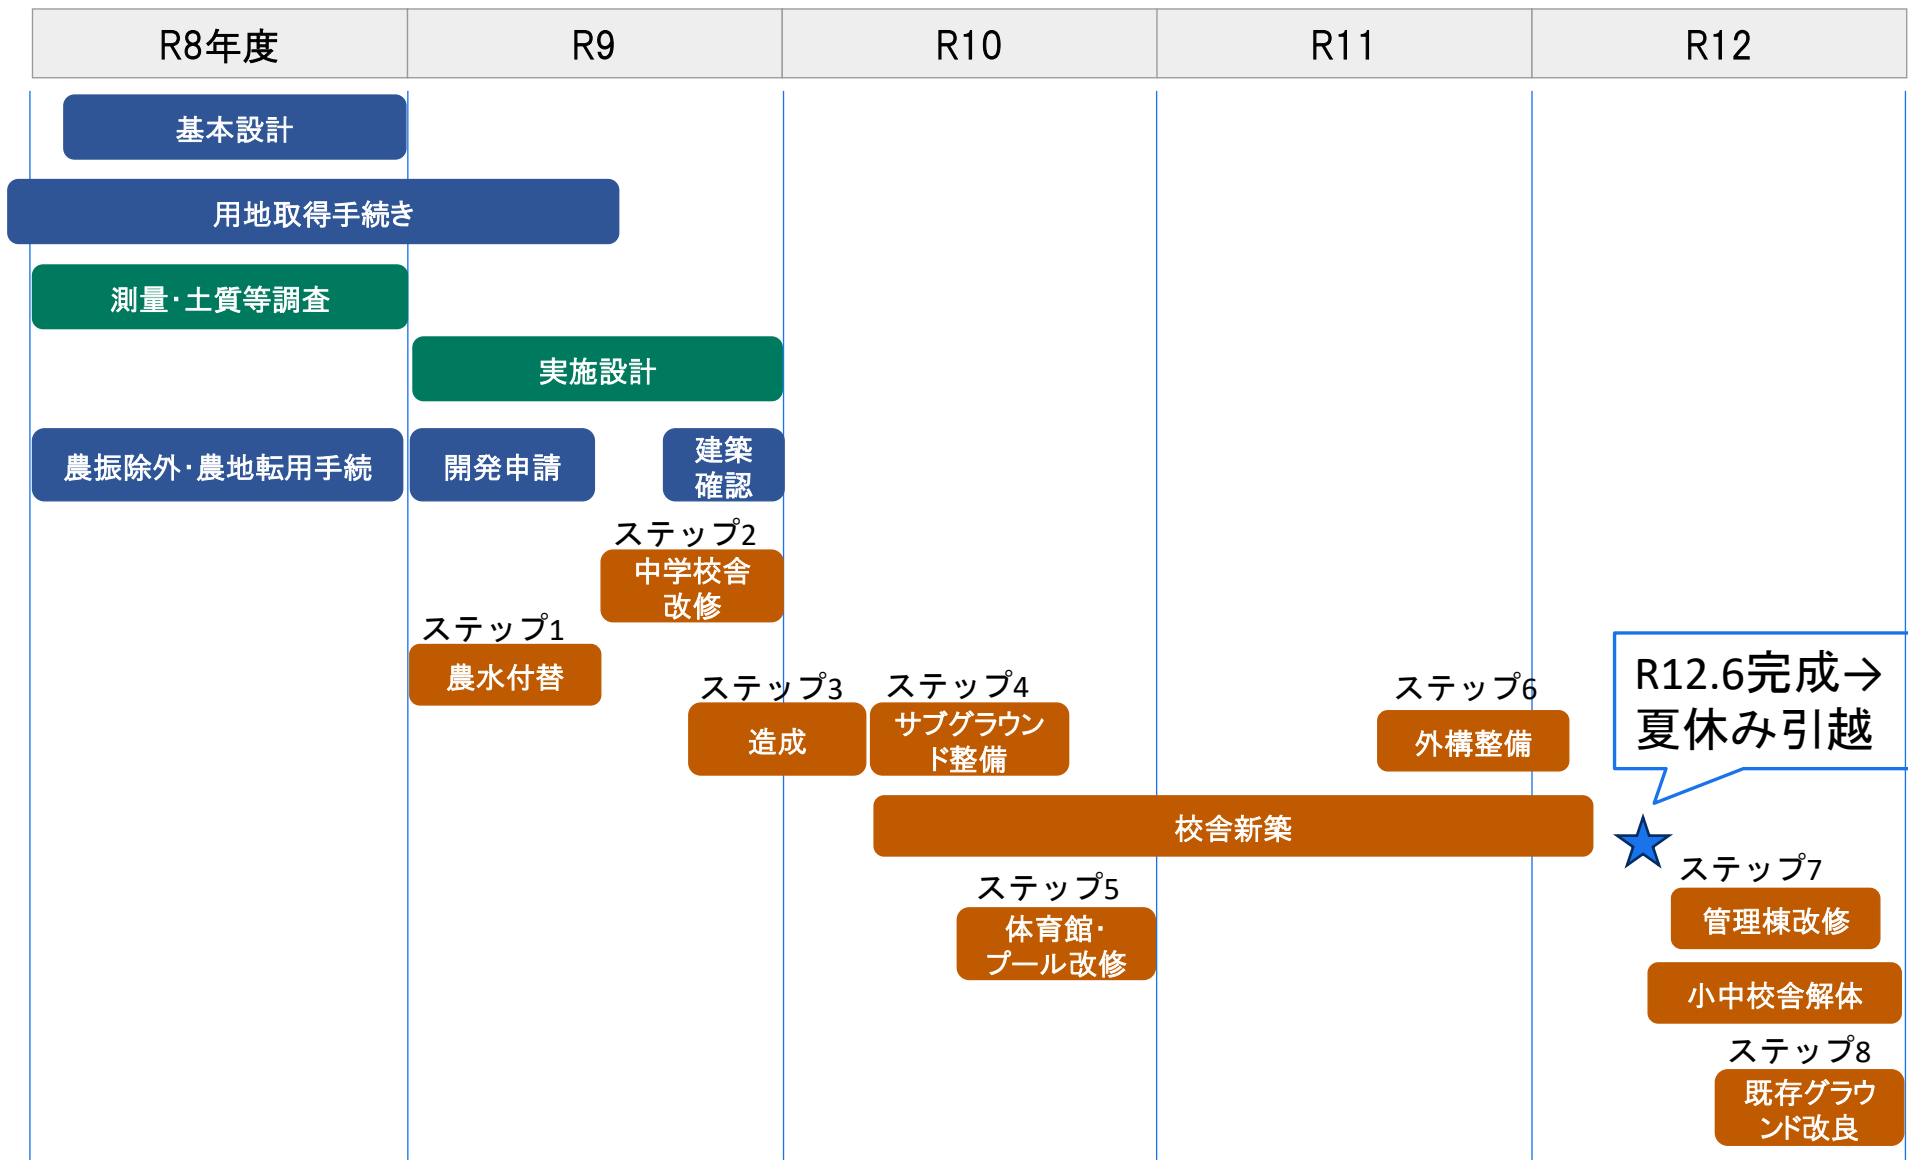

事業の進め方（案）

ステップ1

農水施設の 移設工事

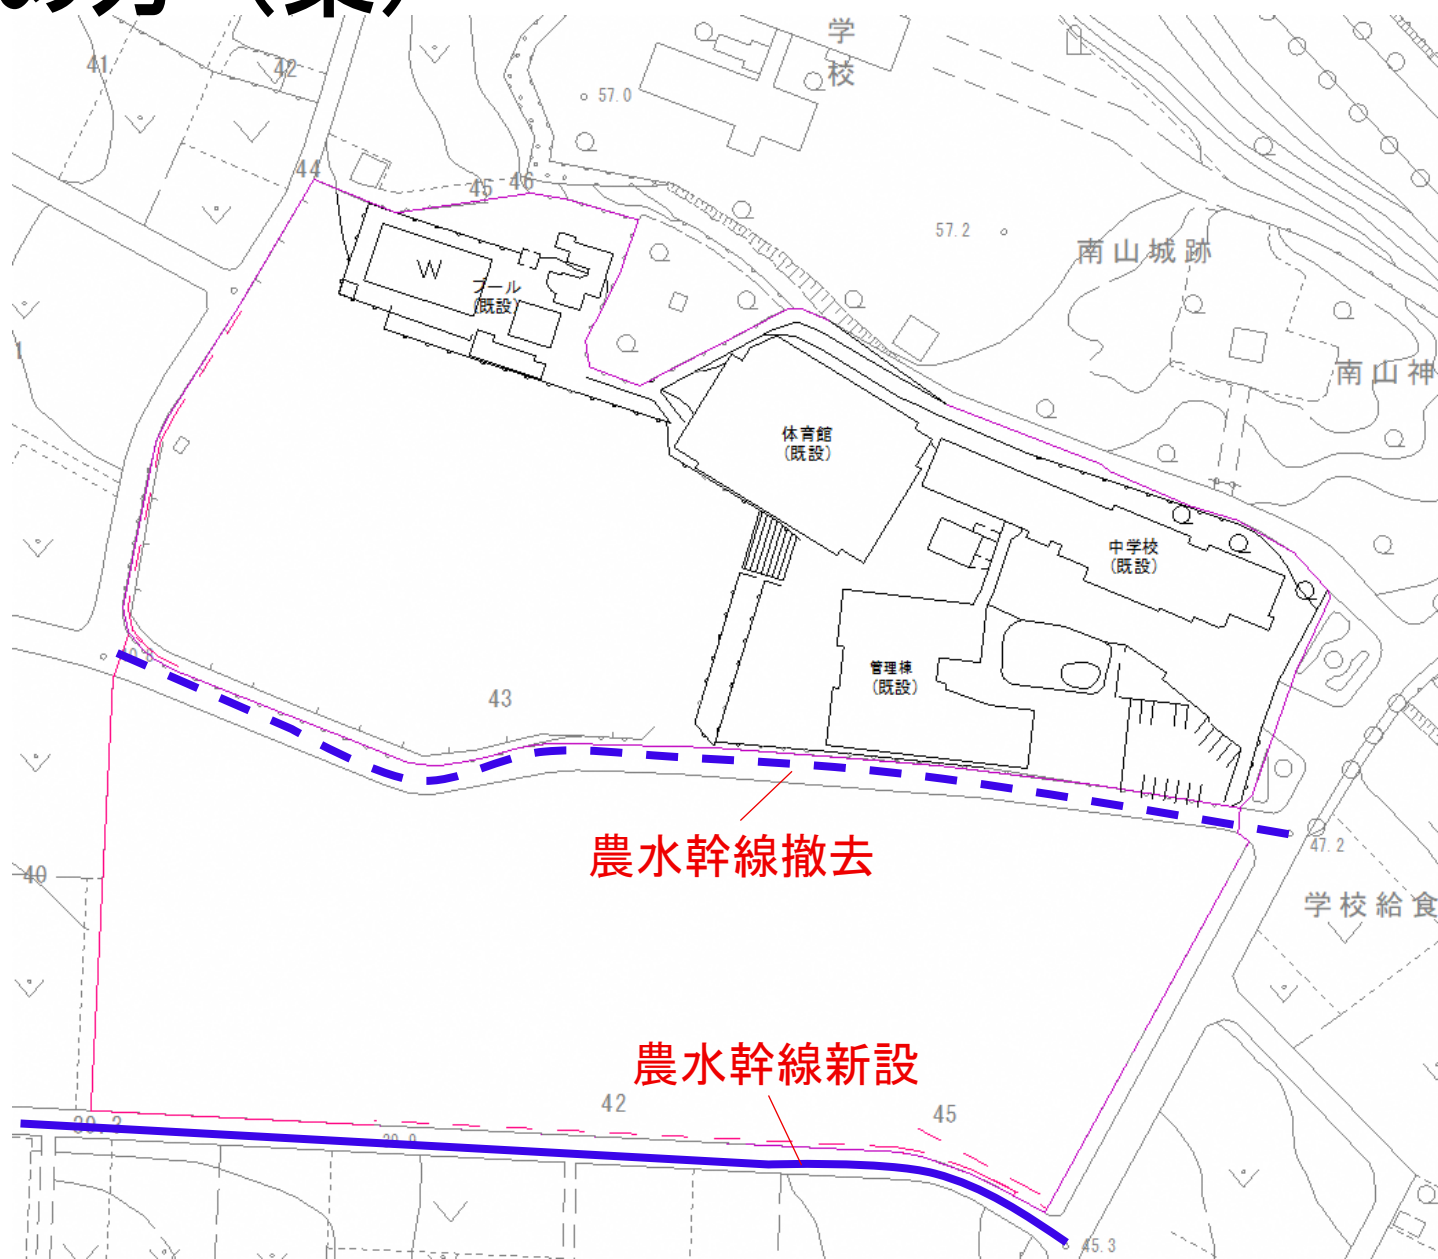


事業の進め方（案）

ステップ2・3

中学校の
改修工事

拡張敷地の
造成工事

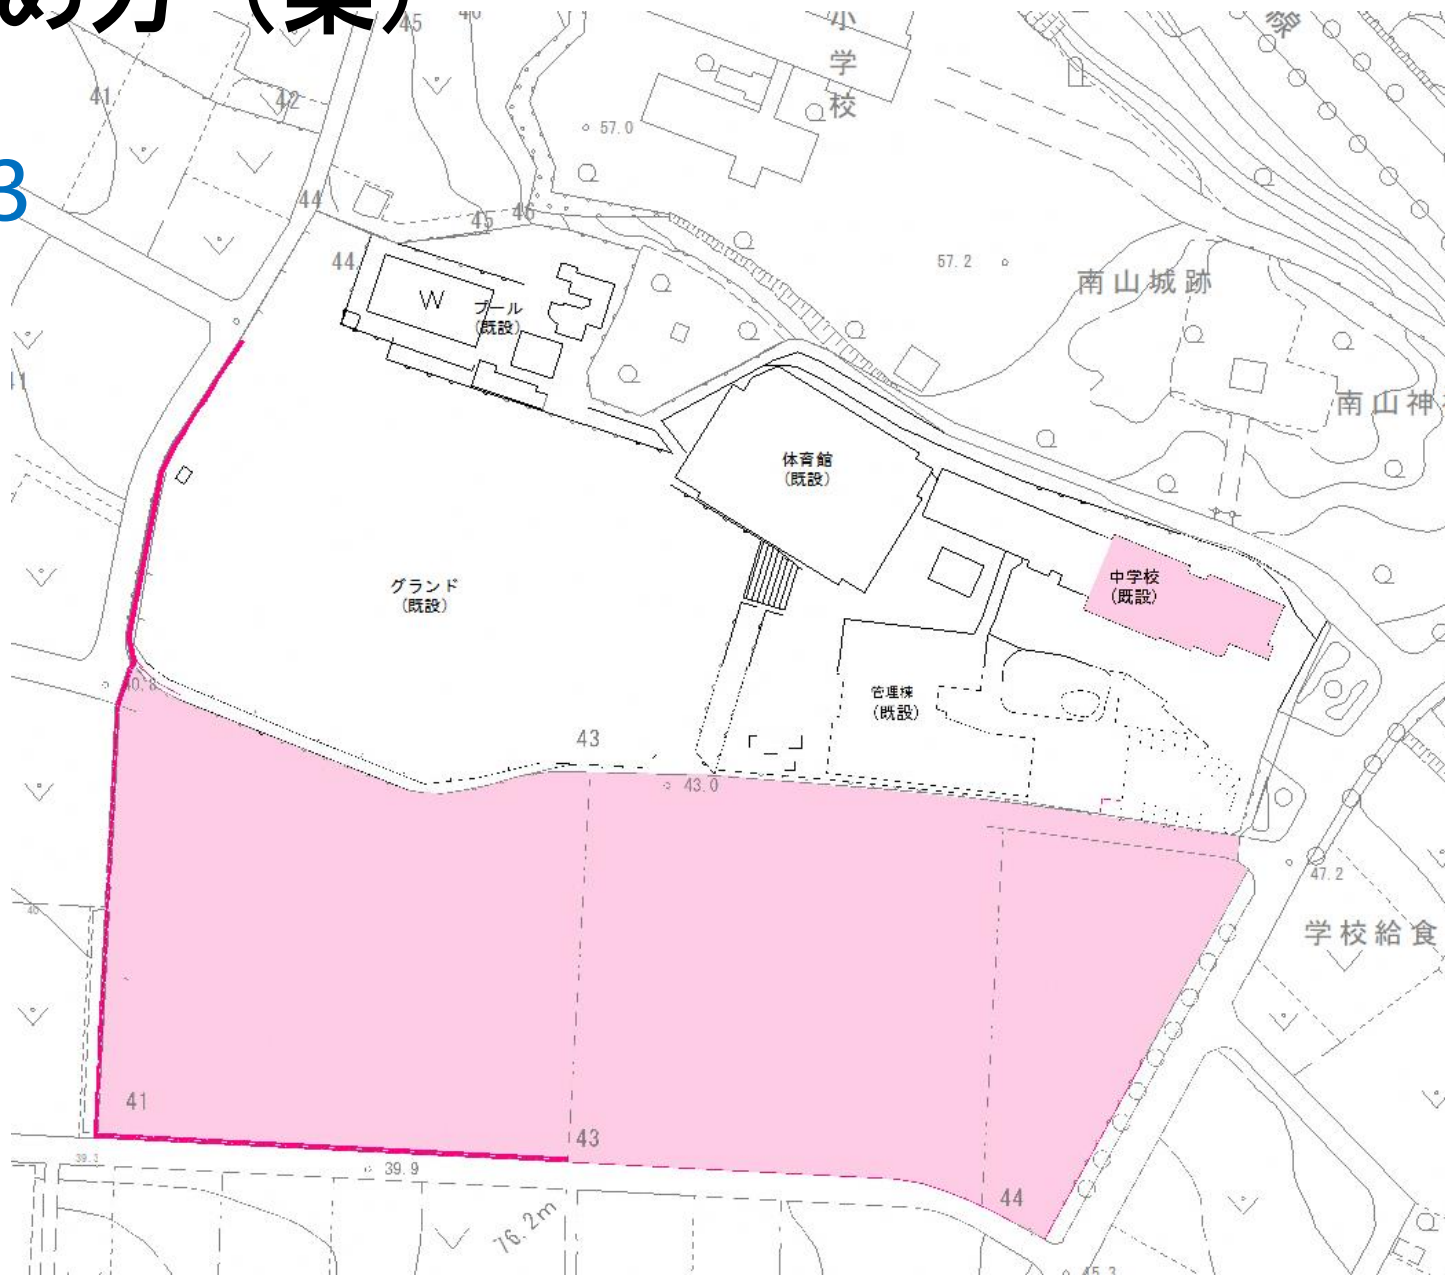

事業の進め方（案）

ステップ4


小・中学校
新築工事

サブグラウンド
整備工事

ステップ5

（4に加え）

体育館・プール
改修工事

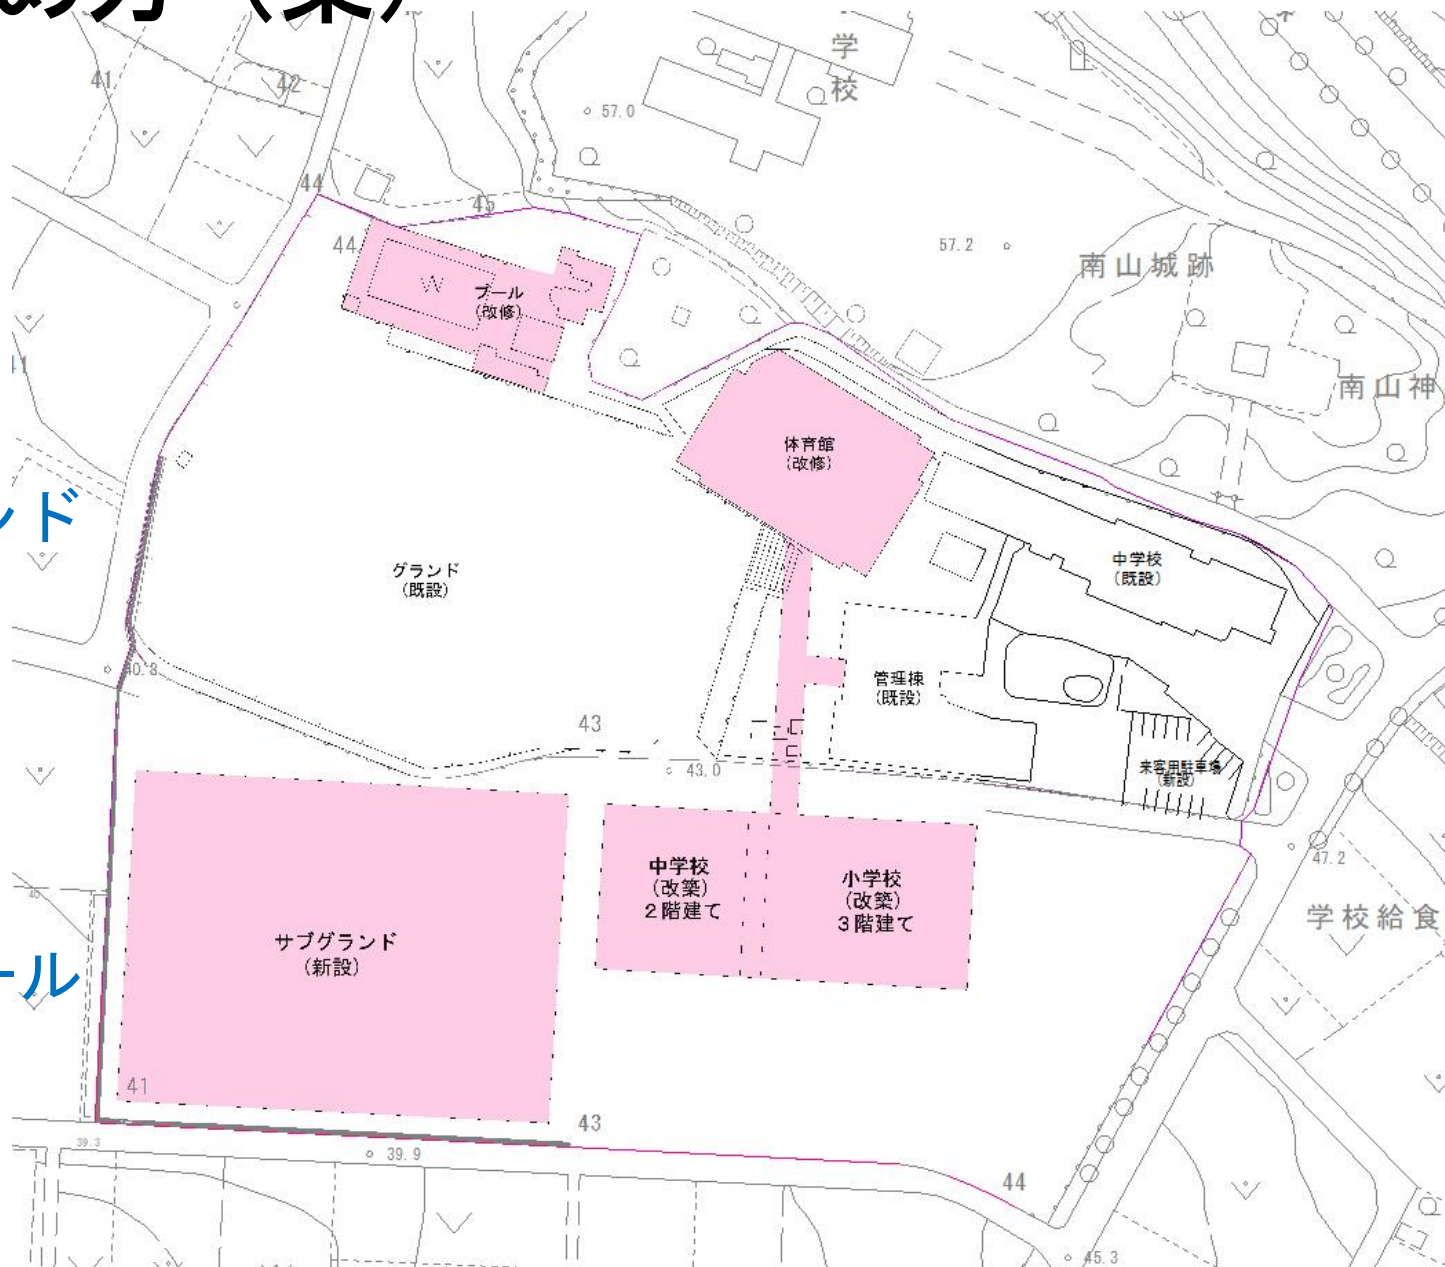


事業の進め方 (案)

ステップ6

(5新築工事に加え)

外構工事

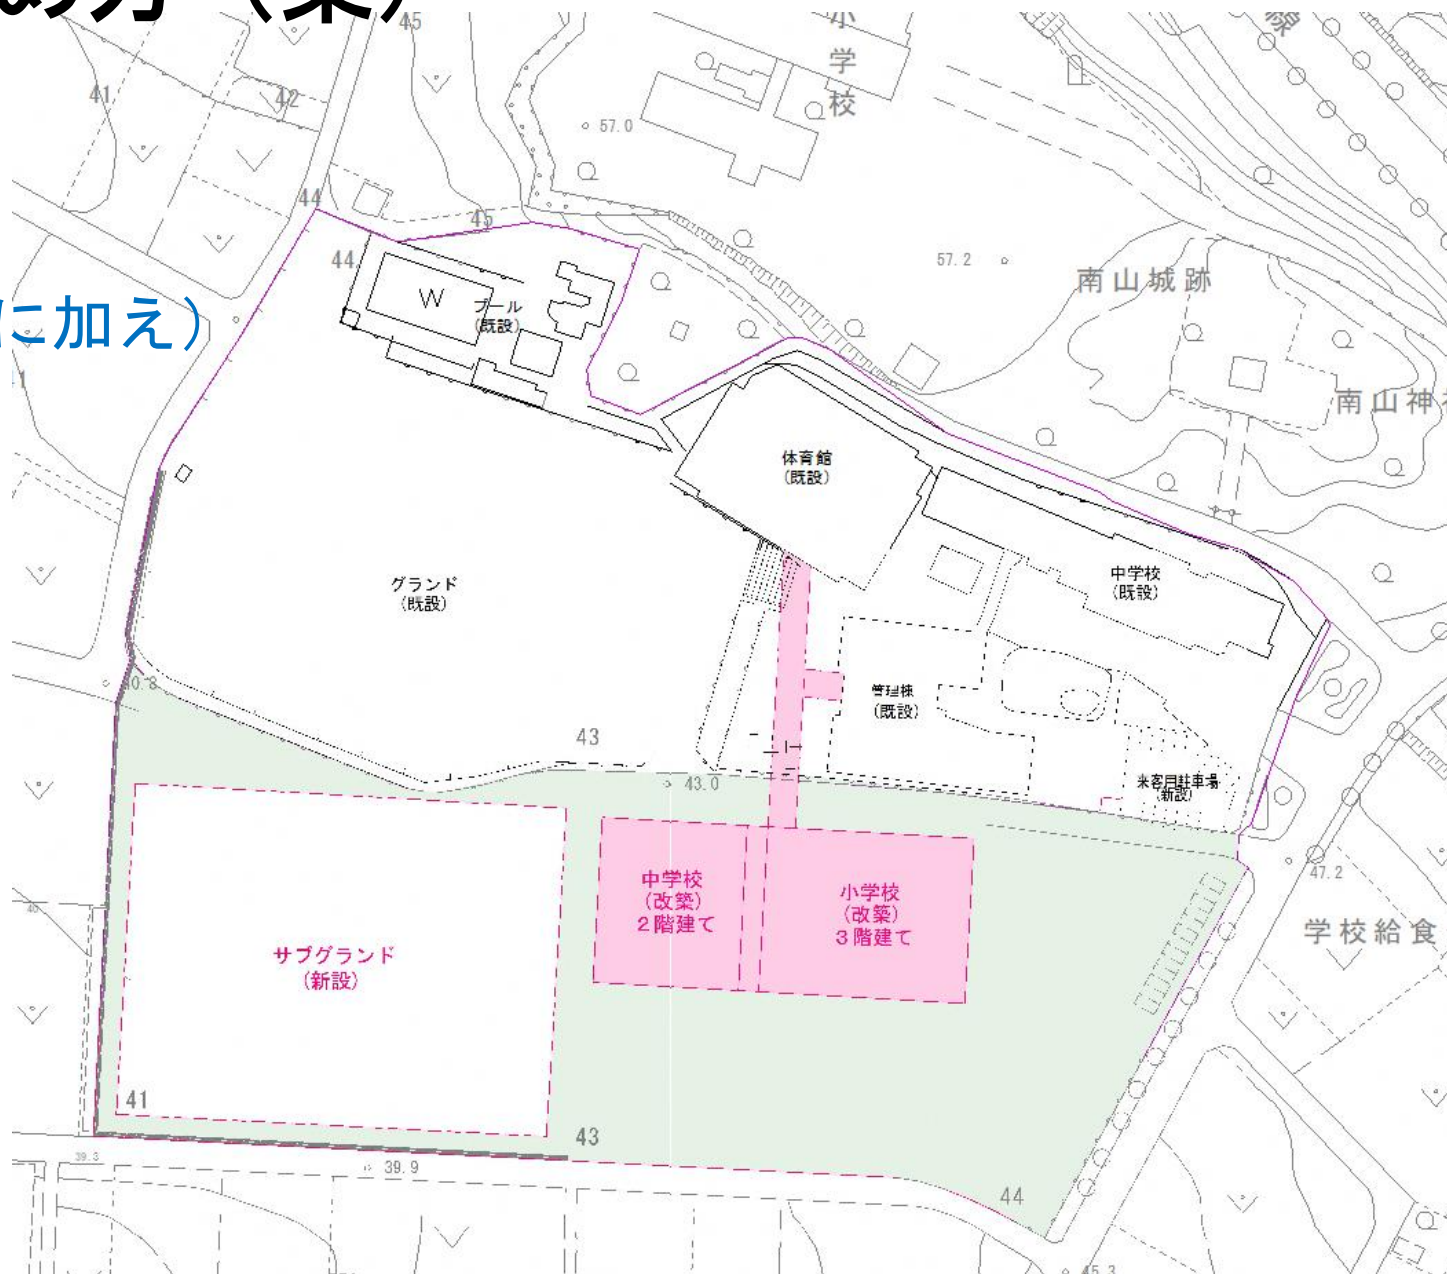

事業の進め方（案）

ステップ7


管理棟改修工事

旧校舎解体工事

ステップ8

（7に加え）

既存グラウンド
改良工事

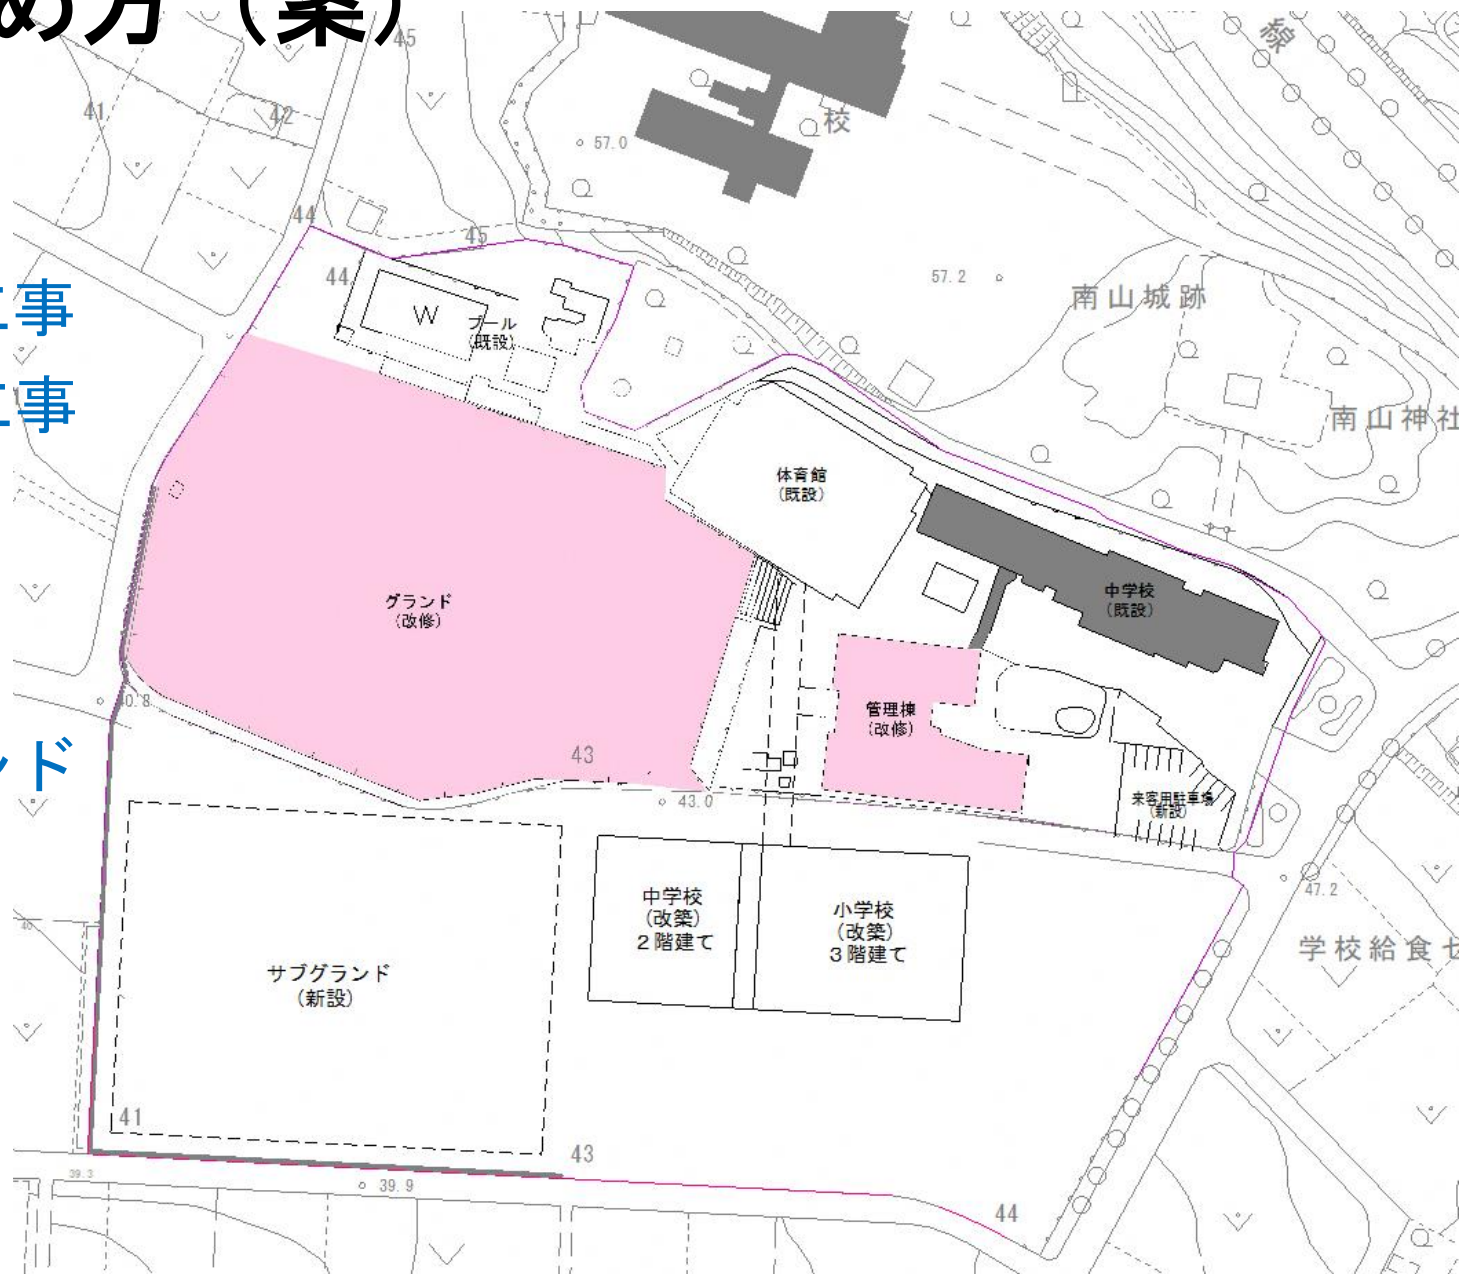

事業費

基本計画段階での概算です。
表中の※印は、過年度算定では本事業の対象外としていたもの

| | | 過年度 (R5)概算 | 今回概算 (R8年度基準) | |
|------|------------------|---------------|---------------|---|
| | | 税込価格 (円) | 税込価格 (円) | 備考 |
| 用地費 | 計 | 125,970,000 | 278,990,936 | |
| | 用地費 | 125,970,000 | 242,777,000 | 取得面積拡大、補償費の考え方の見直し |
| | ※その他 | | 36,213,936 | 【項目追加】鑑定、補償等の委託費 |
| 設計費 | 計 | 308,262,900 | 531,213,280 | |
| | 建築（新築）設計・監理費 | 185,095,900 | 282,322,030 | 中学校校舎改築分を追加、詳細見直し |
| | 建築（改修）設計・監理費 | 41,129,000 | 77,982,135 | 改修面積減。監理範囲見直しで増 |
| | インフラ仮設計画 | 3,399,000 | | 改修設計に含む |
| | 造成及び屋外施設設計費 | 49,555,000 | 51,140,650 | |
| | 造成にかかる土質調査費 | 9,790,000 | 17,623,697 | 造成・建築用一式 |
| | 付替え農道及び農水施設測量 | 4,092,000 | 5,661,370 | |
| | 付替え農道及び農水施設設計 | 15,202,000 | 18,149,340 | |
| | ※その他 | | 78,334,058 | 【項目追加】用地測量、アスベスト調査、建築以外の監理費、現グラウンドの改修設計、解体設計費 |
| 工事費 | 計 | 3,611,940,200 | 4,702,526,027 | |
| | 新設棟建築工事費 | 2,302,740,000 | 3,529,642,600 | 中学校校舎改築分を追加 |
| | 改修工事費 | 663,751,000 | 362,442,216 | 改修面積減 |
| | 造成工事費 | 121,660,000 | 104,185,598 | 擁壁工を縮減 |
| | 土木工事費 | 500,280,000 | 341,962,522 | 現グラウンド活用を前提に縮減 |
| | かん水施設移設工事費 | 23,509,200 | 28,924,776 | |
| | ※その他 | | 335,368,315 | 【項目追加】小学校・中学校校舎解体、現グラウンド改良工事 |
| 物価上昇 | 計 | | 893,071,417 | |
| | ※R8以降の物価上昇影響額見込み | | 893,071,417 | 設計費年7%、工事費年6%で上昇と仮定 |
| 総計 | | 4,046,173,100 | 6,405,801,660 | |

事業費（補助金等の活用）

■ 補助金等の試算（最大期待額）

※歳入は物価上昇を見込んでいません。

| 財源 | 金額 |
|--------------------|---------------|
| A 文科省の国庫補助金 | 1,997,652,000 |
| B 沖縄振興特別推進交付金 | 382,994,440 |
| C 補助事業の自己負担額に対する起債 | 554,300,000 |
| D 単独事業費に対する起債 | 898,600,000 |
| 計 | 3,833,546,440 |

■ 市負担額の試算

| 試算ケース | 工事費上昇率年6%、設計費上昇率年7% |
|-------|---------------------|
| 事業費概算 | 6,405,901,660 |
| 補助額 | 3,833,546,440 |
| 市負担額 | 2,572,255,220 |

事業費

基本計画段階での概算です。

表中の※印は、過年度算定では本事業の対象外としていたもの

| | | 過年度 (R5)概算 | | 今回概算 (R8年度基準) | |
|------|------------------|---------------|---------------|---|--|
| | | 税込価格 (円) | | 税込価格 (円) 備考 | |
| 用地費 | 計 | 125,970,000 | 278,990,936 | | |
| | 用地費 | 125,970,000 | 242,777,000 | 取得面積拡大、補償費の考え方の見直し | |
| | ※その他 | | 36,213,936 | 【項目追加】鑑定、補償等の委託費 | |
| 設計費 | 計 | 308,262,900 | 531,213,280 | | |
| | 建築（新築）設計・監理費 | 185,095,900 | 282,322,030 | 中学校校舎改築分を追加、詳細見直し | |
| | 建築（改修）設計・監理費 | 41,129,000 | 77,982,135 | 改修面積減。監理範囲見直しで増 | |
| | インフラ仮設計画 | 3,399,000 | | 改修設計に含む | |
| | 造成及び屋外施設設計費 | 49,555,000 | 51,140,650 | | |
| | 造成にかかる土質調査費 | 9,790,000 | 17,623,697 | 造成・建築用一式 | |
| | 付替え農道及び農水施設測量 | 4,092,000 | 5,661,370 | | |
| | 付替え農道及び農水施設設計 | 15,202,000 | 18,149,340 | | |
| | ※その他 | | 78,334,058 | 【項目追加】用地測量、アスベスト調査、建築以外の監理費、現グラウンドの改修設計、解体設計費 | |
| 工事費 | 計 | 3,611,940,200 | 4,702,526,027 | | |
| | 新設棟建築工事費 | 2,302,740,000 | 3,529,642,600 | 中学校校舎改築分を追加 | |
| | 改修工事費 | 663,751,000 | 362,442,216 | 改修面積減 | |
| | 造成工事費 | 121,660,000 | 104,185,598 | 擁壁工を縮減 | |
| | 土木工事費 | 500,280,000 | 341,962,522 | 現グラウンド活用を前提に縮減 | |
| | かん水施設移設工事費 | 23,509,200 | 28,924,776 | | |
| | ※その他 | | 335,368,315 | 【項目追加】小学校・中学校校舎解体、現グラウンド改良工事 | |
| 物価上昇 | 計 | | 1,511,258,439 | | |
| | ※R8以降の物価上昇影響額見込み | | 1,511,258,439 | 設計費年7%、工事費年10%で上昇と仮定 | |
| 総計 | | 4,046,173,100 | 7,023,988,683 | | |

事業費（補助金等の活用）

■ 補助金等の試算（最大期待額）

※歳入は物価上昇を見込んでいません。

| 財源 | | 金額 |
|----|------------------|---------------|
| A | 文科省の国庫補助金 | 1,997,652,000 |
| B | 沖縄振興特別推進交付金 | 382,994,440 |
| C | 補助事業の自己負担額に対する起債 | 554,300,000 |
| D | 単独事業費に対する起債 | 898,600,000 |
| 計 | | 3,833,546,440 |

■ 市負担額の試算

| 試算ケース | 工事費上昇率年 10% 、設計費上昇率年7% |
|-------|-------------------------------|
| 事業費概算 | 7,023,988,683 |
| 補助金等額 | 3,833,546,440 |
| 市負担額 | 3,190,442,242 |
